



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CONFERINȚĂ DE PREZENTARE

2 OCTOMBRIE 2024

*Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Dâmbovița*

Cod SMIS 2014+ 152415/ Cod SMIS 2021+ 326257



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Tema conferinței de prezentare

***Evoluția investițiilor și stadiul implementării
„Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Dâmbovița”
cod SMIS 2014+ 152415/ 2021+ 326257***



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Obiectivul general al proiectului regional



Continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, prin creșterea nivelului de colectare și de epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate de țara noastră în sectorul de mediu.

Valoarea totală a proiectului este de 2.673.119.267,87 LEI



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Investiții de reabilitare, extindere și înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în localități din aria de operare

- Târgoviște
- Moreni
- Fieni
- Pucioasa
- Răcari
- Aninoasa
- Băleni
- Brănești
- Braniștea
- Buciumeni
- Bucșani
- Butimanu
- Ciocănești
- Cobia
- Conțești
- Corbii Mari
- Dragodana
- Dragomirești
- Finta
- Glodeni
- Gura Fcii
- Gura Ocniței
- Hulubești
- Iedera
- Lucieni
- Ludești
- Lungulețu
- Malu cu Flori
- Mănești
- Mătăсарu
- Mogoșani
- Moroeni
- Morteni
- Niculești
- Nucet
- Ocnița
- Odobești
- Perșinari
- Petrești
- Pietroșița
- Potlogi
- Produlești
- Răzvad
- Șotânga
- Tătărani
- Ulmi
- Văcărești
- Valea Lungă
- Vișina
- Vulcana Băi
- Vulcana-Pandele
- Găești
- Titu
- Slobozia Moară
- Crângurile
- Sălcioara
- Valea Mare
- Răscăeți
- Doicești
- Dobra



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Prin proiectul de investiții, probleme cum au fost cele legate de întreruperi sau limitarea furnizării apei potabile, cauzate de seceta prelungită, cu scopul de a reface rezerva de apă potabilă din rezervoare vor fi rezolvate.

Localități ca Aninoasa, Bezdead, Brănești, Brezoele, Bucșani, Cândești, Cobia, Cojasca, Doicești, Dragodana, Dragomirești, Fieni, Găești, Glodeni, Gura Ocnitei, Iledera, Moroeni, Moțăieni, Ocnita, Pietroșița, Răzvad, Șotânga sau Valea Lungă nu vor mai fi afectate de perioadele de secetă, așa cum s-a întâmplat în vara acestui an.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
etapă derulată în perioada 30 septembrie 2021 - 31 decembrie 2024**

Valoarea totală a proiectului: 180.534.114,59 LEI (TVA inclus)

Finanțarea nerambursabilă este defalcată astfel:

Fondul de Coeziune: 122.082.036,52 LEI

Bugetul de stat: 18.671.370,29 LEI

Contribuția beneficiarului: 2.872.518,51 LEI

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect: 36.908.189,27 LEI



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, etapă în derulare, în perioada 13.09.2024 – 31.12.2026



Valoarea totală a proiectului: 2.492.585.153,28 LEI (TVA inclus)

Finanțarea nerambursabilă este defalcată astfel:

Fondul European de Dezvoltare Regională: 1.676.647.280,04 LEI

Bugetul de stat: 256.428.407,54 LEI

Contribuția beneficiarului: 39.450.524,23 LEI

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect: 394.153.013,05 LEI



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Principalele investiții în sectorul de alimentare cu apă

Investițiile se derulează în 44 sisteme de alimentare cu apă, care totalizează o populație de 310.597 locuitori din județul Dâmbovița, pe următoarele componente:

- Front de captare (reabilitarea și echiparea fronturilor de captare subterană) – 25 foraje,
- Extindere captare – 21 foraje,
- Conductă de aducțiune – 169,77 km din care 162,94 km reprezintă extindere și 6,83 reabilitare,
- Stații de tratare – 2 buc. noi și 1 buc. extindere,
- Stații de clorinare – 15 buc. din care 6 buc. noi, 2 buc. extinderi și 7 buc. reabilitări,
- Rezervoare de înmagazinare – 27 buc. din care 11 buc. noi și 16 buc. reabilitare,
- Stație de pompare apă potabilă, inclusiv hidrofoare – 61 buc. din care 38 buc. noi și 23 reabilitare,
- Rețea de distribuție – 346,31 km din care 286,91 km extindere și 59,4 km reabilitare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Principalele investiții în sectorul epurării apelor uzate

- Rețea de canalizare: 730,72 km din care 723,67 km rețea nouă și 7,05 rețea reabilitată,
- Colector nou – 5,89 km,
- Conducte de refulare – 190,08 km din care 188,53 km conductă nouă și 1,55 km reabilitată,
- Stații de pompare apă uzată – 527 buc. din care 524 noi și 3 buc. reabilitate,
- Stații de epurare a apelor uzate – 9 buc. din care 2 noi și 7 extinderi,
- Platformă de depozitare nămol din stații de epurare ape uzate – 3 unități.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de lucrări: contracte de tip proiectare și execuție

- DB-CL-01: Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari
- DB-CL-02: Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești
- DB-CL-03: Surse de apă, rezervoare, clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Hulubești, Dragodana, Gura Fcii, Mogosani, Mătășaru, Crângurile, Ludești, Petrești, Morteni și Vișina
- DB-CL-04: Surse de apă, stație de tratare, rezervoare, stații de pompare, conducte de aducțiune pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta
- DB-CL-05: Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori
- DB-CL-06: Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătășaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Visina, Potlogi, Găesti, Titu



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de lucrări: contracte de tip execuție lucrări (1)

- DB-CL-07: Realizare stație de deferizare-demanganizare Valea Lungă
- DB-CL-08 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi
- DB-CL-09: Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni
- DB-CL-10: Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni
- DB-CL-11: Înființare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, Iedera, Valea Lungă
- DB-CL-12: Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana-Băi, Vulcana - Pandele și Brănești
- DB-CL-13: Extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești și Tătărani



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de lucrări: contracte de tip execuție lucrări (2)

- DB-CL-14: Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Nucet, Perșinari, Văcărești, Lucieni și Ludești
- DB-CL-15: Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Fcii, Cobia, Mogosani și Mătășaru
- DB-CL-16: Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Braniștea, Conțești
- DB-CL-17: Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori
- DB-CL-18 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta
- DB-CL-19 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Butimanu, Niculești, Ciocănești



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de furnizare

- DB-CF-01 Furnizare și montaj instalații de compensare automată a energiei reactive
- DB-CF-02 LOT 1 Furnizare utilaje și echipamente operaționale
- DB-CF-02 LOT 2 Furnizare utilaje și echipamente operaționale
- DB-CF-03 Furnizare echipamente contoare apă
- DB-CF-04 Achiziție și implementare echipamente și software sistem informatic integrat GIS / SCADA / Control Managerial
- DB-CF-05 Achiziție echipamente și dotări laborator



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Contracte de servicii



- DB-CS-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”
- DB-CS-02 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” (componenta „Asistență tehnică acordată de proiectant pe durata execuției lucrărilor”)
- DB-CS-03 Servicii de audit al Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Rezultate așteptate (1)

- Apă:

Asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman în aria de proiect.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Rezultate așteptate (2)

- Apă uzată:

Asigurarea conformării cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate în aria de proiect.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Rezultatele așteptate ale proiectului regional



Prin proiectul regional se vor realiza următorii indicatori:

- ✓ CO18 (distribuția apei: populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă) = 121.992 locuitori
- și
- ✓ CO19 (epurarea apelor uzate: populație care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate) = 119.886 locuitori echivalenți.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (1)

DB-CL-01 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Perșinari



- Acord contractual nr. 5303/215POIM din 15.02.2022; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 16.03.2022, perioadă execuție până la 10.12.2024;

Lucrări executate: Extindere conductă aducțiune 10.706 ml, reabilitare conductă aducțiune 6.620 ml, reabilitare rezervor Priseaca 1 buc (2 compartimente), reabilitare Stație Pompare Dragomirești Sud, reabilitare Stație Pompare Viforâta, extindere Stație Pompare Teiș; reabilitare rezervor Vulcana Băi, înlocuire stație de clorinare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (2)

DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

- Acord contractual nr. 20211/1685-POIM din 07.07.2022; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 08.08.2022, perioadă execuție până la 07.08.2025;
- Se lucrează la reabilitarea Gospodăriilor de apă : GA Titu, GA Conțești, GA Răcari, GA Lungulețu, GA Potlogi, GA Produlești și GA nouă Ciocănești; se reabilitează forajele 1 ÷ 10 din Braniștea.

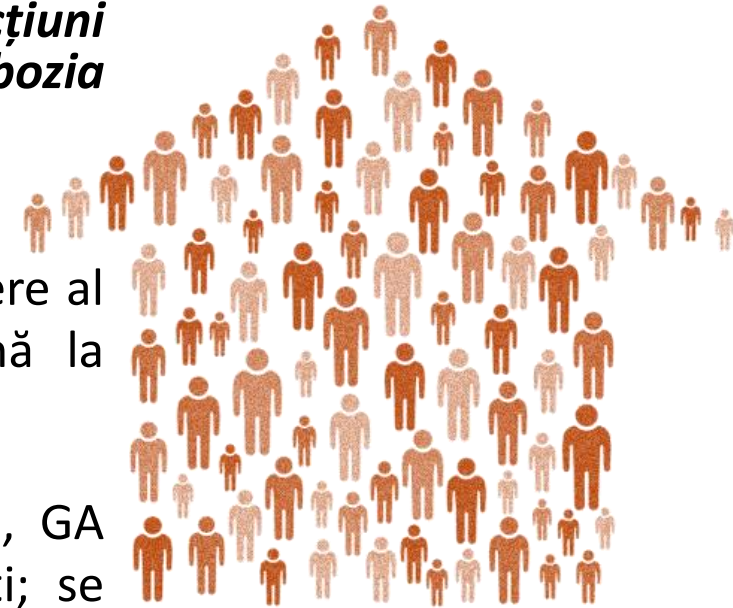

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (3)



DB-CL-04 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Butimanu, Niculești, Dobra, Bucșani, Băleni, Finta

- Acord contractual nr.36561/4753-POIM din 23.08.2024;
- Încă nu a fost emis Ordinul de Începere al lucrărilor;
- Perioadă execuție: 20 de luni



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (4)



DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

- Acord contractual nr. 34142/3189-POIM din 16.11.2022;
- Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 25.01.2023;
- Perioadă execuție până la 24.11.2024;
- Contractul se află în etapa de proiectare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (5)

DB-CL-08 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Ulmi

- Acord contractual nr. 3794/338-POIM din 31.01.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor emis cu data de 27.03.2023, perioadă execuție până la 26.12.2024:
- U.A.T. Târgoviște – executat 1.270 ml rețea apă și 608 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Aninoasa – executat 1.385 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Șotânga – executat 1.363 ml rețea apă, 725 ml rețea canalizare, 1.503 ml conductă refulare;
- U.A.T. Ulmi – executat 1.954 ml rețea canalizare;

Total executat: 2.633 ml rețea apă, 4.672 ml rețea canalizare și 1.503 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (6)

DB-CL-09 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pucioasa, Fieni, Moroeni, Pietroșița, Buciumeni

- Acord contractual nr. 28101/3611-POIM din 21.09.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 20.12.2023, perioadă execuție până la 19.11.2026
- U.A.T. Pucioasa – executat 250 ml rețea apă, 320 ml rețea canalizare și 290 ml conductă refulare;
- U.A.T. Fieni – executat 310 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Buciumeni – executat 500 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Moroeni – executat 390 ml rețea apă și 340 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Pietroșița – executat 250 ml rețea canalizare;

Total executat: 455 ml rețea apă, 657 ml rețea canalizare și 250 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (7)

DB-CL-10 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni

- Acord contractual nr. 29335/3889-POIM din 05.10.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 22.12.2023, perioadă execuție până la 21.04.2026;
- U.A.T. Răzvad – executat 675 ml rețea canalizare și 4.612 ml conductă refulare;
- U.A.T. Ocnița – executat 1.242 ml rețea canalizare și 710 ml conductă refulare;
- U.A.T. Gura Ocniței – executat 1.330 ml rețea de canalizare

Total executat: 1.582 ml rețea canalizare și 4.694 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (8)



DB-CL-11 *Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Moreni, Iedera, Valea Lungă*

- Acord contractual nr. 31455/3739-POIM din 08.07.2024;
- Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 05.09.2024;
- Perioadă execuție 26 de luni.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (9)

DB-CL-12 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vulcana Băi, Vulcana Pandele și Brănești

- Acord contractual nr. 38107/5813-POIM din 20.12.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 07.03.2024, perioadă execuție până la 06.10.2025;
- U.A.T. Vulcana Băi – executat 540 ml rețea apă și 340 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Vulcana Pandele – executat 4.041 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Brănești – executat 3.112 ml rețea canalizare;

Total executat: 540 ml rețea apă și 7.493 ml rețea canalizare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (10)

DB-CL-13 *Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Dragomirești, Mănești, Tătărani*

- Acord contractual nr. 36933/3508-POIM din 15.12.2022; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 01.03.2023, perioadă execuție până la 31.07.2025;
- U.A.T. Dragomirești – executat 16.920 ml rețea canalizare și 3.453 ml conductă refulare;

- U.A.T. Mănești – executat 8.809 ml rețea canalizare și 203 ml conductă refulare;
- U.A.T. Tătărani – executat 470 ml rețea apă și 9.111 ml rețea canalizare;

Total executat: 470 ml +rețea apă, 34.840 ml rețea canalizare și 3.656 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (11)

DB-CL-15 *Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Fcii, Cobia, Mogoșani și Mătășaru*

- Acord contractual nr. 27185/3456-POIM din 12.09.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 23.11.2023, perioadă execuție până la 22.09.2026;
- U.A.T. Hulubești – executat 1.977 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Potlogi – executat 16.571 ml rețea apă;
- U.A.T. Odobești – executat 4.487 ml rețea apă;

- U.A.T. Corbii Mari – executat 8.866 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Dragodana – executat 14.375 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Gura Fcii – executat 6.077 ml rețea apă și 3.733 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Cobia – executat 2.288 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Mătășaru – executat 885 ml rețea canalizare;

Total executat: 27.135 ml rețea apă și 32.124 ml rețea canalizare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (12)

DB-CL-16 *Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Răcari, Lungulețu, Produlești, Branîștea, Conțești*

- Acord contractual nr. 32759/3026-POIM din 04.11.2022; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 09.01.2023, perioadă execuție până la 08.05.2025;
- U.A.T. Răcari – executat 23.123 ml rețea apă, 21.757 ml rețea canalizare și 3.062 ml conductă refulare;
- U.A.T. Lungulețu – executat 7.109 ml rețea canalizare și 933 ml conductă refulare;

- U.A.T. Produlești – executat 11.412 ml rețea canalizare și 15.383 ml conductă refulare;
- U.A.T. Branîștea – executat 3.782 ml rețea apă, 3.425 ml rețea canalizare și 446 ml conductă refulare;
- U.A.T. Conțești – executat 11.918 ml rețea canalizare și 7.772 ml conductă refulare;

Total executat: 26.905 ml rețea apă, 55.621 ml rețea canalizare și 27.596 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (13)

DB-CL-17 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vișina, Morteni, Petrești, Malu cu Flori

- Acord contractual nr. 38108/5814-POIM din 20.12.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 07.03.2024, perioadă execuție până la 06.04.2026;
- U.A.T. Vișina – executat 1.888 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Morteni – executat 1.628 ml rețea canalizare;
- U.A.T. Petrești – executat 1.704 ml rețea canalizare;

Total executat: 5.220 ml rețea canalizare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (14)

DB-CL-18 Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta

- Acord contractual nr. 24505/3124-POIM din 17.08.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 23.10.2023, perioadă execuție până la 22.12.2025;
- U.A.T. Băleni – executat 4.322 ml rețea apă, 4.751 ml rețea canalizare și 1.458 ml conductă refulare;
- U.A.T. Bucșani – executat 600 ml rețea apă, 12.275 ml rețea canalizare și 1.700 ml conductă refulare;

Total executat: 4.922 ml rețea apă, 17.026 ml rețea canalizare și 3.158 ml conductă refulare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (15)

DB-CL-19 *Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Butimanu, Niculești, Ciocănești*

- Acord contractual nr. 10007/1019-POIM din 23.03.2023; Ordinul de Începere al lucrărilor a fost emis cu data de 31.05.2023, perioadă execuție până la 31.01.2025;
- U.A.T. Butimanu – executat 18.260 ml rețea apă;
- U.A.T. Niculești – executat 5.403 ml rețea apă;
- U.A.T. Ciocănești – executat 24.622 ml rețea apă;

Total executat: 48.258 ml rețea apă.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Evoluția contractelor de lucrări (16)

Total conducte executate:

Rețea apă: 111.530 ml (aproximativ 111 km)

Rețea canalizare: 160.633 ml (aproximativ 160 km)

Conductă aducțiune: 17.326 ml (aproximativ 17 km)

Conductă refulare: 42.855 ml (aproximativ 43 km)



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Elemente de publicitate ale proiectului regional



Asigurarea publicității proiectului, promovarea adecvată a măsurilor de informare și publicitate privind finanțarea acordată de Uniunea Europeană prin cele două fonduri europene, Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională și informarea corectă a populației privind lucrările și obiectivele propuse prin proiect se vor realiza prin derularea *Activității 8 - Pregătirea și implementarea campaniei de publicitate și promovare a Proiectului.*

Campania de informare se va derula prin organizarea a 53 de întâlniri de promovare în localitățile din aria de proiect, precum și prin organizarea a 4 conferințe de prezentare.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Vă mulțumim pentru atenție și interes!

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Târgoviște, bd. Ion Constantin Brătianu nr.50, județ Dâmbovița

secretariat.uip@catd.ro

www.catd.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

(Etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (Etapa II)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
